

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和03年08月18日

計画の名称	西尾市における下水道の安全対策の推進計画（防災・安全）											
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	西尾市											
計画の目標	下水道施設の長寿命化対策を行うことにより、市民が安心して暮らせる環境を目指す。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	796	A	796	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30年度当初	H32年度末	H34年度末
1	主要な管渠の点検・調査実施率を0%（H30当初）から100%（H34末）にする。 主要な管渠の点検・調査実施率 調査・点検済み延長 / H30～H34調査・点検延長（60km）	0%	53%	100%
2	下水道施設（汚水・雨水）の点検・調査実施率を0%（H33当初）から100%（H34末）にする。 ポンプ場の点検・調査実施率 調査・点検済み箇所 / H33～H34調査・点検箇所（3箇所） 雨水：一色西部ポンプ場、荻原ポンプ場 汚水：荻原中継ポンプ場	0%	0%	100%
3	スtockマネジメント計画に位置付け改築を実施した管渠の割合を0%から74%にする。 管渠の改築・更新実施率 改築・更新を実施した延長（m） / 改築・更新が必要な延長（m）	0%	0%	74%
4	スtockマネジメント計画に位置付け改築を実施したマンホールの割合を0%から50%にする。 マンホールの改築・更新実施率 改築・更新を実施した箇所数（基） / 改築・更新が必要な箇所数（基）	0%	0%	50%
5	スtockマネジメント計画に位置付け改築を実施したマンホール蓋の割合を0%から100%にする。 マンホール蓋の改築・更新実施率 改築・更新を実施した箇所数（基） / 改築・更新が必要な箇所数（基）	0%	70%	100%
6	下水道施設（汚水・雨水）の耐水化計画策定率を0%から100%にする。 ポンプ場の耐水化計画策定率 耐水化計画策定済み箇所 / 耐水化計画が必要な箇所（2箇所） 雨水：荻原ポンプ場 汚水：荻原中継ポンプ場	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	西尾市	直接	西尾市	管渠(汚水)	改築	管渠・人孔等 点検・調査	L=60km	西尾市						450		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-002	下水道	一般	西尾市	直接	西尾市	ポンプ場	改築	ポンプ場(汚水・雨水) 点検・調査	3箇所	西尾市						150		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-003	下水道	一般	西尾市	直接	西尾市	管渠(汚水)	改築	管渠 実施設計・改築	L=506m	西尾市						146		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-004	下水道	一般	西尾市	直接	西尾市	管渠(汚水)	改築	マンホール 実施設計・改築	4基	西尾市						19		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-005	下水道	一般	西尾市	直接	西尾市	管渠(汚水)	改築	マンホール蓋 改築	57基	西尾市						23		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-006	下水道	一般	西尾市	直接	西尾市	ポンプ場	改築	耐水化計画	2箇所	西尾市						8		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
											小計						796		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
											合計						796		

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制

中間評価の実施時期

西尾市上下水道部下水道整備課において実施

令和3年8月実施

公表の方法

西尾市ホームページに掲載

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

下水道施設の長寿命化対策を推進し、機能確保と災害発生時に起こる事故の未然防止に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）


特記事項（今後の方針等）

引き続き下水道施設の長寿命化及び耐水化対策を推進する。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	主要な管渠の点検・調査実施率		
	中間 目標値	53%	優先的に事業を推進したため、中間目標値を上回ることができた。
	中間 実績値	97%	
2	ポンプ場の点検・調査実施率		
	中間 目標値	0%	優先的に事業を推進したため、中間目標値を上回ることができた。
	中間 実績値	100%	
3	管渠の改築・更新実施率		
	中間 目標値	0%	
	中間 実績値	0%	
4	マンホールの改築・更新実施率		
	中間 目標値	0%	
	中間 実績値	0%	
5	マンホール蓋の改築・更新実施率		
	中間 目標値	70%	他事業を優先的に実施したため、目標値に差異が生じた。
	中間 実績値	7%	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
6	ポンプ場の耐水化計画策定率	
	中間 目標値	0%
	中間 実績値	0%

計画の名称	西尾市における下水道の安全対策の推進計画（防災・安全）		
計画の期間	平成30年度 ～ 令和4年度（5年間）	交付対象	西尾市

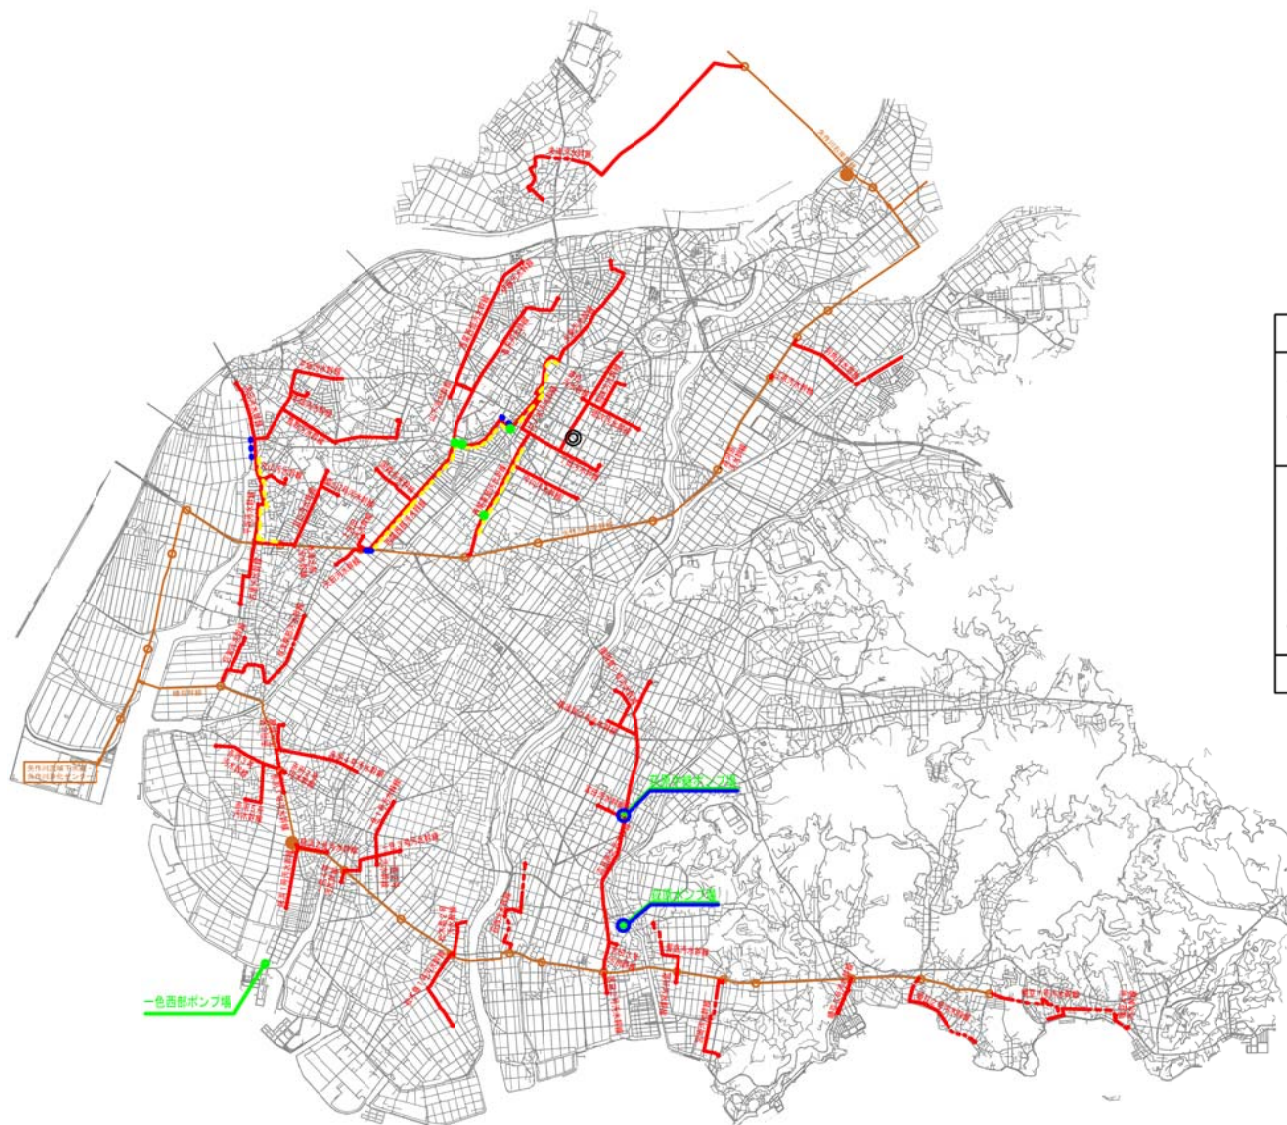

		凡	例
施工済	A07-001	—	主要な管渠の点検調査
	A07-002	Ⓟ	ポンプ場点検調査
	A07-005	—	マンホール蓋の改築
未施工	A07-001	- - -	主要な管渠の点検調査
	A07-003	- - -	管渠の実施設計・改築
	A07-004	●	マンホールの実施設計・改築
	A07-005	- - -	マンホール蓋の改築
	A07-006	Ⓟ	耐水化計画
		—	流域下水道
